

Programa de Gerencia Pública y Gobernabilidad Democrática

DESCONTAMINACION DE LAS ADYACENCIAS DEL RÍO
GOAIGOAZA, EN LA CALLE PRINCIPAL MIQUIJA, SECTOR
MIQUIJA, PARROQUIA GOAIGOAZA, MUNICIPIO PUERTO
CABELLO.

Participantes:

Otero Ifill Edgar José. V-24.574.69

García Abinazar Eilimar Adeli. V-20.980.275

Torres Hinds Leonelstanly de Jesús. V-24.304.988

Septiembre de 2024

TABLA DE CONTENIDO

Contenido	Pág.
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO	
1. UBICACIÓN, SITUACIÓN INICIAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO	
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
4. RESULTADOS ESPERADOS	
5. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN	
5.1. Fin	
5.2. Propósito	
5.3. Componentes	
6. POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	
7. PLAN DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	
7.1. Las actividades del proyecto.	
7.2. La puesta en marcha	
8. RECURSOS REQUERIDOS	
9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
10. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD, LA PARTICIPACIÓN Y LA APROPIACIÓN.	
11. ANEXOS OBLIGATORIOS	
11.1. Análisis de involucrados.	
11.2. Árbol de problema	
11.3. Árbol de objetivos	
11.4. Matriz de Marco Lógico	
12. OTROS ANEXOS	
☐ BIBLIOGRAFÍA	
☐	

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

1. **Nombre del Proyecto:**

Descontaminación de las adyacencias del Río Goaigoaza, en el SECTOR MIQUIJA, PARROQUIA GOAIGOAZA, MUNICIPIO PUERTO CABELLO.

2. **Breve descripción del proyecto:**

La presente propuesta se focaliza en la descontaminación de las adyacencias del Río Goaigoaza, en el SECTOR MIQUIJA, CALLE PRINCIPAL DE MIQUIJA, PARROQUIA GOAIGOAZA, MUNICIPIO PUERTO CABELLO, en aras de que la comunidad procure y vele por un ordenamiento planificado y organizado de recolección de desechos, que represente un estado de calidad de vida mejorado, desplazando problemas que atañen la contaminación en materia de salubridad, acompañado de los impactos en ámbitos sociales y económicos que configuran una situación sostenible y perdurable.

3. **Ubicación detallada:**

Adyacencias del Río Goaigoaza, SECTOR MIQUIJA, CALLE PRINCIPAL MIQUIJA, PARROQUIA GOAIGOAZA, MUNICIPIO PUERTO CABELLO. Los beneficiarios directos son de LA CALLE PRINCIPAL MIQUIJA que cuenta con 78 habitantes.

4. **Duración total del proyecto:**

Este proyecto tendrá una duración de cuatro (04) meses, el cual dentro de esos cuatro meses se dispondrá de un (1) mes para el monitoreo post jornada.

5. **Responsable del proyecto:**

Edgar Jose Otero Ifill

Correo electrónico: ifilledgar@gmail.com

Teléfono: 0424-4713213

1. UBICACIÓN, SITUACIÓN INICIAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A través de la observación, los investigadores lograron comprobar en fecha 22 de Junio de 2024, la presencia de objetos contaminantes de diversa composición en las adyacencias del río Goaigoaza, específicamente en la calle principal de Miquija, sector Miquija, Parroquia Goaigoaza, Municipio Puerto Cabello, zona rural medianamente urbanizada donde existen en los alrededores inmediatos la cantidad de veinte (20) viviendas; situación cuyos efectos adversos pudiesen extenderse a distintos sectores de la Parroquia tales como Santa Cruz y Cumboto II, en virtud de que este cuerpo acuático surte del vital líquido a través de las redes de suministro de dicho servicio estas zonas; además de los diversos problemas que atañen el mal uso de espacios naturales como vertedero improvisado de basura sin ningún tipo de planificación urbanística formal u organizada. Esta zona se caracteriza por la mezcla de espacios naturales con espacios intervenidos por el hombre para ser destinados a la vivienda, generando una coexistencia entre especies naturales de plantas, insectos y animales con los humanos, lo que da una perspectiva amplia de efectos a ser estudiados, ya que, a pesar de que la contaminación no se da precisamente en las viviendas aledañas, al haberse creado un sistema de convivencia y relaciones intrínsecas a la cercanía, trae una serie de consecuencias de índole económicos, ambientales, ecológicos y principalmente desde la óptica de los autores, de salubridad para los habitantes de la ubicación ya especificada.

Esta combinación de entornos, amerita un respeto del hombre con el ambiente ya que al ser una ordenación de escasa planificación urbanística, la deforestación y el desplazamiento de espacios naturales, no se encuentra realizado con la medida necesaria para garantizar los derechos colectivos e individuales de jerarquía constitucional que tiene la población en general de gozar de un sistema ecológico equilibrado, sano y seguro, conforme el artículo 127 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela; a su vez, teniendo en cuenta que de la Teoría General del Derecho deviene que, acarrea a todo derecho, una obligación intrínseca

como elemento para la existencia del Derecho en sí; por ende, la contaminación culposa o voluntaria de estos sectores rurales representa contravenciones al sistema jurídico nacional, donde estos se consideran como un patrimonio público, para garantizar un futuro sustentable.

Dicho esto, la presente iniciativa busca, en resumidas cuentas, concretar soluciones a la situación expuesta como núcleo de la problemática; enfatizando la investigación en la calificación previa y posterior de las condiciones ambientales por parte de los habitantes de la zona, como elemento resultante de una actuación conjunta viable propuesta por los autores en su desarrollo y aprobada por los principales involucrados, mediante la promulgación del ordenamiento propuesto y el llamado a tomar conciencia sobre la afección que perciben con la materialización constante de la contaminación; para su posterior ejecución dentro de un marco de planificación estratégica política.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se pretende a través de toda esta estructura de planificación, lograr principalmente la descontaminación de las adyacencias del Río Goaiagoza, mediante jornadas de recolección ejecutadas por el ente municipal competente con participación de habitantes involucrados. Subsiguientemente, sentar las bases para mantener limpio de desechos sólidos el espacio en cuestión, a través de la organización de espacios acordados y preparados por la comunidad para el desecho de residuos; esfuerzos de concientización de los habitantes del foco de la situación problemática y habitantes de zonas aledañas que se encuentran a mayor altitud, quienes contaminan el cuerpo acuático, siendo que estos entes contaminantes siguen el caudal del agua hasta el sector objeto de estudio; realizados por representantes de ambas comunidades; así como coordinación con el ente del gobierno local con competencia en recolección de desechos, para efectuar las diligencias necesarias para el mantenimiento programático y suficiente del sector, vigilando cualquier desviación de la situación ideal planteada.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La contaminación de espacios focalizados, trae consigo la proliferación acelerada de bacterias y gérmenes que conllevan a una diversidad de problemas incompatibles con la vivienda y coexistencia con espacios rurales; en el presente caso, se observa la existencia de estos tres elementos afectando al menos una totalidad de 78 personas que habitan la calle del sector referido, ocasionándoles enfermedades y disminución de su calidad de vida. La inobservancia del problema planteado, representa un riesgo de brotes epidemiológicos con alcance a demás sectores de la parroquia; consecuentemente, la permanencia de estos agentes contaminantes termina afectando la rutina diaria de los ciudadanos quienes al verse enfermos son imposibilitados de trabajar, estudiar, realizar labores de hogar, familiares y actividades recreativas. Es por ello, que podemos afirmar que tal situación vulnera derechos constitucionales del ciudadano de índole ecológicos, sanitarias y recreativos; cuya importancia amerita ser atendida no solo por los interesados sino por autoridades competentes.

Por ende, por medio de la presente propuesta que sugiere adoptar un ordenamiento planificado, con participación de la comunidad, para dar alcance a la voluntad de resolución que pudieren tener algunos habitantes, uniendo esfuerzos de manera estratégica y organizada, factores claves para el éxito.

4. RESULTADOS ESPERADOS

La aplicación de las medidas aquí propuestas, pretenden generar un beneficio multidimensional para los habitantes del sector que se manifiestan en:

- La recuperación de un espacio con potencial recreativo;
- Una imagen limpia y sana del sector que denote bienestar;
- Fomentar la integración de los habitantes afectados en una causa ambiental;
- Establecer condiciones que hagan perdurable unas acciones de saneamiento ejecutadas.
- Lograr una percepción positiva de los habitantes del sector, con respecto a la calidad de vida que ofrece el territorio objeto de la propuesta.

5. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

5.1 Fin

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la calle principal de Miquija mediante condiciones ambientales saludables.

5.2 Propósito

Descontaminar adyacencias del Río Goaigoaza, en el sector miquija, calle principal de miquija, parroquia Goaigoaza, Municipio Puerto Cabello.

5.3 Componentes

- Realizar Campañas de Concientización y promulgación de las ideas de ordenamiento de gestión de la basura y la necesidad de esfuerzos de descontaminación plasmados en el presente proyecto. Se realiza 4 reuniones con el consejo comunal del sector para dar a conocer el proyecto, la planificación y logística de las actividades que se van a desarrollar, así como también compartir lluvias de ideas para las actividades; se plantean 2 reuniones con el ente IAMPROAM para notificar sobre el proyecto y concretar en qué puede colaborar. También, se dictan 6 charlas con personal de iamproam en el espacio comunes de las comunidades para reclutar voluntariado, donación de insumos, 1 actividad recreativa para motivar al sector y 1 reunión para evaluar y coordinar lo que se ha reclutado para la jornada.

Este componente tiene un periodo de 2 meses a ejecutar.

- Adecuar los espacios de la comunidad para ser destinados a la recolección de desechos sólidos en la zona afectada y limpieza exhaustiva de la Zona de foco del presente estudio. Se van a realizar 3 jornadas de limpieza en el espacio ya acordado del sector con una duración de 4 días consecutivos; así como también la compra e instalación de los 4 contenedores de basura.

- Mejorar el servicio prestado por IAMPROM, obteniendo planificaciones acordes al volumen de generación de cuerpos contaminantes. Se realizan 4 reuniones, 3 con el ente IAMPROM para la planificación y seguimiento del servicio de recolección de basura en el área donde se ejecutó el proyecto y 1 reunión con los habitantes de la calle miquija con el fin de conocer si está satisfecho con la nueva planificación del servicio de aseo.

6. POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los beneficiarios directos son en la CALLE PRINCIPAL MIQUIJA que cuenta con 20 casas que conforman 78 personas y el ente encargado de la recolección de basura

Los beneficiarios indirectos son el resto del SECTOR GOAIGOAZA cercanos a la calle MIQUIJA conformados por 114 casas 350 habitantes.

Estos datos fueron recolectados gracias al censo del consejo comunal.

7. PLAN DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

7.1 Las actividades del proyecto.

COMPONENTES	ACTIVIDADES
Realizar campañas de concientización a la comunidad central y cercana	Campaña de promulgación casa por casa y en espacios comunes del ordenamiento de recolección, para generar publicidad y procurar voluntariado
	Reunión con las autoridades de IAMPROM para plantear la problemática, la planificación de solución y procurar recursos para la jornada
Adecuación de espacios.	Ejecutar Jornadas de Limpieza
	Planificación, Organización y disposición de espacios adecuados con Contenedores de basura
Mejorar el servicio de recolección de basura	Coordinación con autoridad de IAMPROM para procurar aumentar la frecuencia de recolección
	Seguimiento de la planificación de recolección

[illegible]

7.2 La puesta en marcha

Siguiendo el orden lógico de la presente propuesta, el desarrollo de las actividades será ejecutado siguiendo las directrices que se detallan:

Coordinación con consejos comunales: Una vez realizado el enlace con los dirigentes de los consejos comunales, los autores del proyecto agendarán reuniones donde se explicarán los planes y detalles del proyecto para convencerlos de que sean asignados participantes para coadyuvar en la etapa de organización. Posteriormente se efectuará un registro fotográfico de la zona afectada para preparar un informe que será presentado a las autoridades de IAMPROAM. En esta misma etapa, se ocupará tiempo en el adiestramiento a los participantes para la organización y ejecución del proyecto, procurando desarrollar la apropiación para la captación de voluntariado.

Coordinación con autoridad de IAMPROAM: sentadas bases de apropiación del proyecto, se efectuarán diligencias donde participarán representantes del consejo comunal y los autores del proyecto, para presentar el informe de la zona afectada, pasando por las solicitudes formales y procurando agendar una reunión con las autoridades de dicho ente para realizar directamente las peticiones de mano de obra, insumos, herramientas y recursos necesarios para ejecutar el proyecto.

Campañas de concientización a las comunidades: Una vez formadas cuadrillas, se realizará la visita casa por casa de las zonas donde se hablará a los habitantes de la situación problemática, las diversas consecuencias y cómo afectan a sus familias. Adicionalmente, se adoptará la modalidad de promulgar las medidas necesarias a implementar para la jornada de limpieza, en espacios públicos. Se atraerá la atención del público con actividades recreativas orientadas a los niños, donde se promocionará el propósito y el fin del proyecto; todo ello procurando reclutar voluntariado y captar donaciones monetarias y de insumos necesarios para la ejecución del proyecto.

Jornadas de limpieza: Una vez captados los recursos necesarios, los autores del proyecto como instancia administradora, se encargará del conteo y adquisición de insumos necesarios para la ejecución de las jornadas de limpieza. Listos los preparativos para su ejecución, se efectuará la recolección de desechos en las adyacencias del Río Goaiñoaza, en la zona afectada, dejando constancia mediante registros fotográficos, a su vez se firmará una lista de asistencia para el otorgamiento de incentivos a los participantes.

Disposición de contenedores de basura: Los autores del proyecto como instancia administradora, se encargará de la adquisición de cuatro contenedores de basura para clasificar y depositar los desechos sólidos en dos espacios estratégicos que ya han sido publicitados mediante la campaña de concientización. Los contenedores serán ubicados e identificados para el uso por parte de la comunidad.

Coordinación con autoridad de IAMPROAM para procurar aumentar la frecuencia de recolección: Los autores del proyecto junto con representantes del Consejo comunal de la zona afectada, efectuaran las diligencias para manifestar al ente encargado de la recolección de desechos, los resultados de las jornadas, y elevar la petición para aumentar la frecuencia del servicio, justificando la solicitud en la cantidad de desechos recolectados en la jornada y en los contenedores por semana.

Seguimiento de la planificación del servicio de basura: la autoría del proyecto, se encargará de dirigirse a los puntos de recolección a fines de medir la cantidad de tiempo que tarda la comunidad en llenar los contenedores dispuestos, demostrando los resultados a la junta comunal, quienes se encargaran a futuro de velar por el cumplimiento de la planificación del servicio de aseo urbano.

8. RECURSOS REQUERIDOS

Recursos requeridos Análisis de costos				análisis de costos		
Partida	Descripción específica del recurso requerido	Unidad de medida	Cant.	Costo unitario	Costo total	Sub total x partida
Recursos humanos	personal de iamproam para la limpieza	hh	320	\$ 1,25	\$ 400,00	\$ 400,00
	Personal de logística	hh	96	\$ 1,25	\$ 120,00	\$ 120,00
	personal por el voluntariado del sector	hh	320	0	0	0
	personal recreativo	hh	25	\$ 1,66	\$ 41,50	\$ 41,50
Materiales y suministros	Bolsas	UNID	500	\$ 0,30	\$ 150,00	\$ 150,00
	Guantes	UNID	20	\$ 1,00	\$ 20,00	\$ 20,00
	Machetes	UNID	5	\$ 8,00	\$ 40,00	\$ 40,00
	Rastrillos	UNID	5	\$ 10,00	\$ 50,00	\$ 50,00
	Palas	UNID	5	\$ 11,00	\$ 55,00	\$ 55,00
	Lentes	UNID	10	\$ 5,00	\$ 50,00	\$ 50,00
	Hielo	UNID	100	\$ 1,50	\$ 150,00	\$ 150,00
	Agua	LTRS	50	\$ 0,70	\$ 35,00	\$ 35,00
	Vasos	UNID	200	\$ 5,00	\$ 5,00	\$ 5,00
	Contenedor Para Basura Plastico De Polietileno 120lts	UNID	4	\$ 100,00	\$ 400,00	\$ 400,00
transporte	pendon	UNID	2	\$ 25,00	\$ 50,00	\$ 50,00
	transporte para la coordinacion del consejo comunal	VIAJE	8	\$ 5,00	\$ 40,00	\$ 40,00
	transporte para la coordinacion AUTORIDAD DE IAMPROAM	VIAJE	4	\$ 5,00	\$ 20,00	\$ 20,00
	transporte para la campaña de concientizacion	VIAJE	16	\$ 5,00	\$ 80,00	\$ 80,00
	transporte para la jornada de limpieza	VIAJE	6	\$ 20,00	\$ 120,00	\$ 120,00
	transporte para la compra y traslado de contenedores	VIAJE	6	\$ 10,00	\$ 60,00	\$ 60,00
	transporte para la coordinacion AUTORIDAD DE IAMPROAM	VIAJE	4	\$ 5,00	\$ 20,00	\$ 20,00
otros costos	transporte para la coordinacion AUTORIDAD DE IAMPROAM	VIAJE	4	\$ 5,00	\$ 20,00	\$ 20,00
	Refrigerio consejo comunal	UND	5	\$ 15,00	\$ 75,00	\$ 75,00
	refrigerio iamproam	UND	4	\$ 15,00	\$ 60,00	\$ 60,00
	refrigerio campaña de concientizacion	UND	27	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00
	refrigerio limpieza de las adyacencias del rio	UND	27	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 80,00
	TOTAL PROYECTO					\$ 2.221,50

9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Indicadores verificables de logro	Medios de verificación
Se logró la opinión positiva del 90% de la comunidad sobre la mejora de los espacios al finalizar el proyecto	Encuesta
Ha disminuido en un 100% la presencia de desechos sólidos en el espacio adyacente al río y zona habitacional, al finalizar el proyecto	Registro fotográfico
- Se realizó 4 reuniones con el consejo comunal, Se dictan 6 charlas en espacios comunes de las comunidades para reclutar voluntariado, donación de insumos y promulgar normas de convivencia ambiental	Registro fotográfico
- Se plantea a IAMPROM la situación problemática para contar con su disposición y conseguir apoyo en insumos o mano de obra en al menos dos reuniones	Registro fotográfico / Cartas de donación / constancia de participación
- Ejecución de 3 Jornadas de limpieza para eliminar la totalidad de los desechos sólidos en la zona en cuestión	Informe de cantidad de objetos contaminantes por metro cuadrado
- Disposición de dos espacios comunes, adecuados con 4 contenedores para la clasificación y el depósito temporal y rutinario de desechos	Cantidad de contenedores dispuestos, apreciables en registro fotográfico y constantes en facturación
Duplicar la frecuencia de recolección semanal por parte del servicio municipal	Cantidad de veces que se ejecuta el servicio semanalmente según documento de planificación de IAMPROM

10. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD, LA PARTICIPACIÓN Y LA APROPIACIÓN.

- Alternativas de mano de obra: En principio se desea plantear la situación problemática al ente con competencia en recolección de desechos municipal, para que apoye con trabajadores o herramientas, sin embargo, a través de las campañas de concientización se planea reclutar voluntarios para efectuar la limpieza de la zona afectada, quienes serán dotados de los insumos necesarios para la labor y se ofrecerá un incentivo por apoyar su ejecución.
- Delegación de funciones a la junta comunal: la planeación, organización y ejecución del proyecto, incluirá la participación de los sujetos responsables de la junta

comunal del sector afectado para realizar el enlace entre los autores y las personas afectadas. La autoría del proyecto se encarga de la dirección del mismo, sin embargo la participación de los consejos comunales es fundamental para dar luces a la dirección en aspectos sociales como la cultura y costumbres de los habitantes del sector. Una vez realizada la adquisición de indumentaria, recursos no monetarios y herramientas necesarias; la junta comunal resguardará los bienes obtenidos en la Base de Misiones Aristóbulo Isturiz, acogiéndolos como propios.


- Sucesión de dirección post ejecución: una vez ejecutadas la totalidad de labores programadas, habiendo sido demostrada la factibilidad del proyecto, será responsabilidad del consejo comunal adoptar las medidas de supervisión y verificación de los indicadores de logro, haciendo propias las actividades aquí planteadas, para mantener los objetivos alcanzados y dar continuidad a los fines propuestos.

11. ANEXOS OBLIGATORIOS


11.1 Análisis de involucrados.

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN				
BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	NEUTRALES / EXCLUIDOS	PERJUDICADOS / OPONENTES PRINCIPALES	IMPLICADOS SECUNDARIOS
- Habitantes de la Calle MIQUIJA, SECTOR GOAIGOAZA, MUNICIPIO PUERTO CABELLO. - Ente con competencia en gestión de desechos sólidos.	- Habitantes del resto del SECTOR GOAIGOAZA.	- Habitantes de otros sectores del municipio PUERTO CABELLO no especificados.	- Responsables del vertimiento frecuente de basura en el río, como medio para desechar la basura.	- Habitantes del sector MIQUIJA

11.2 Árbol de problemas

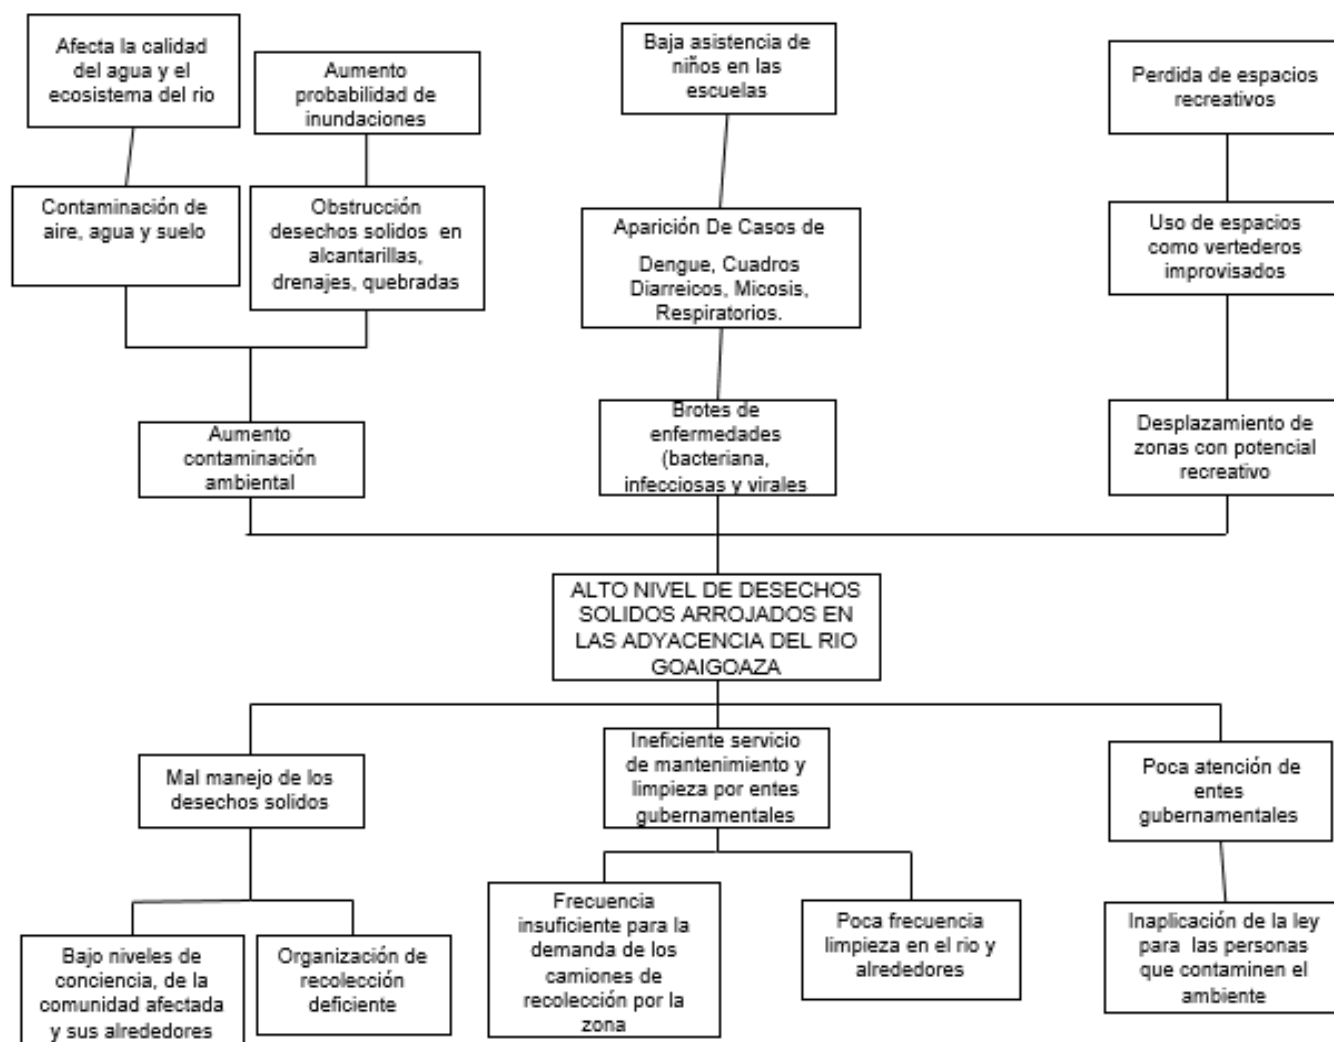

11.3 Árbol de objetivos

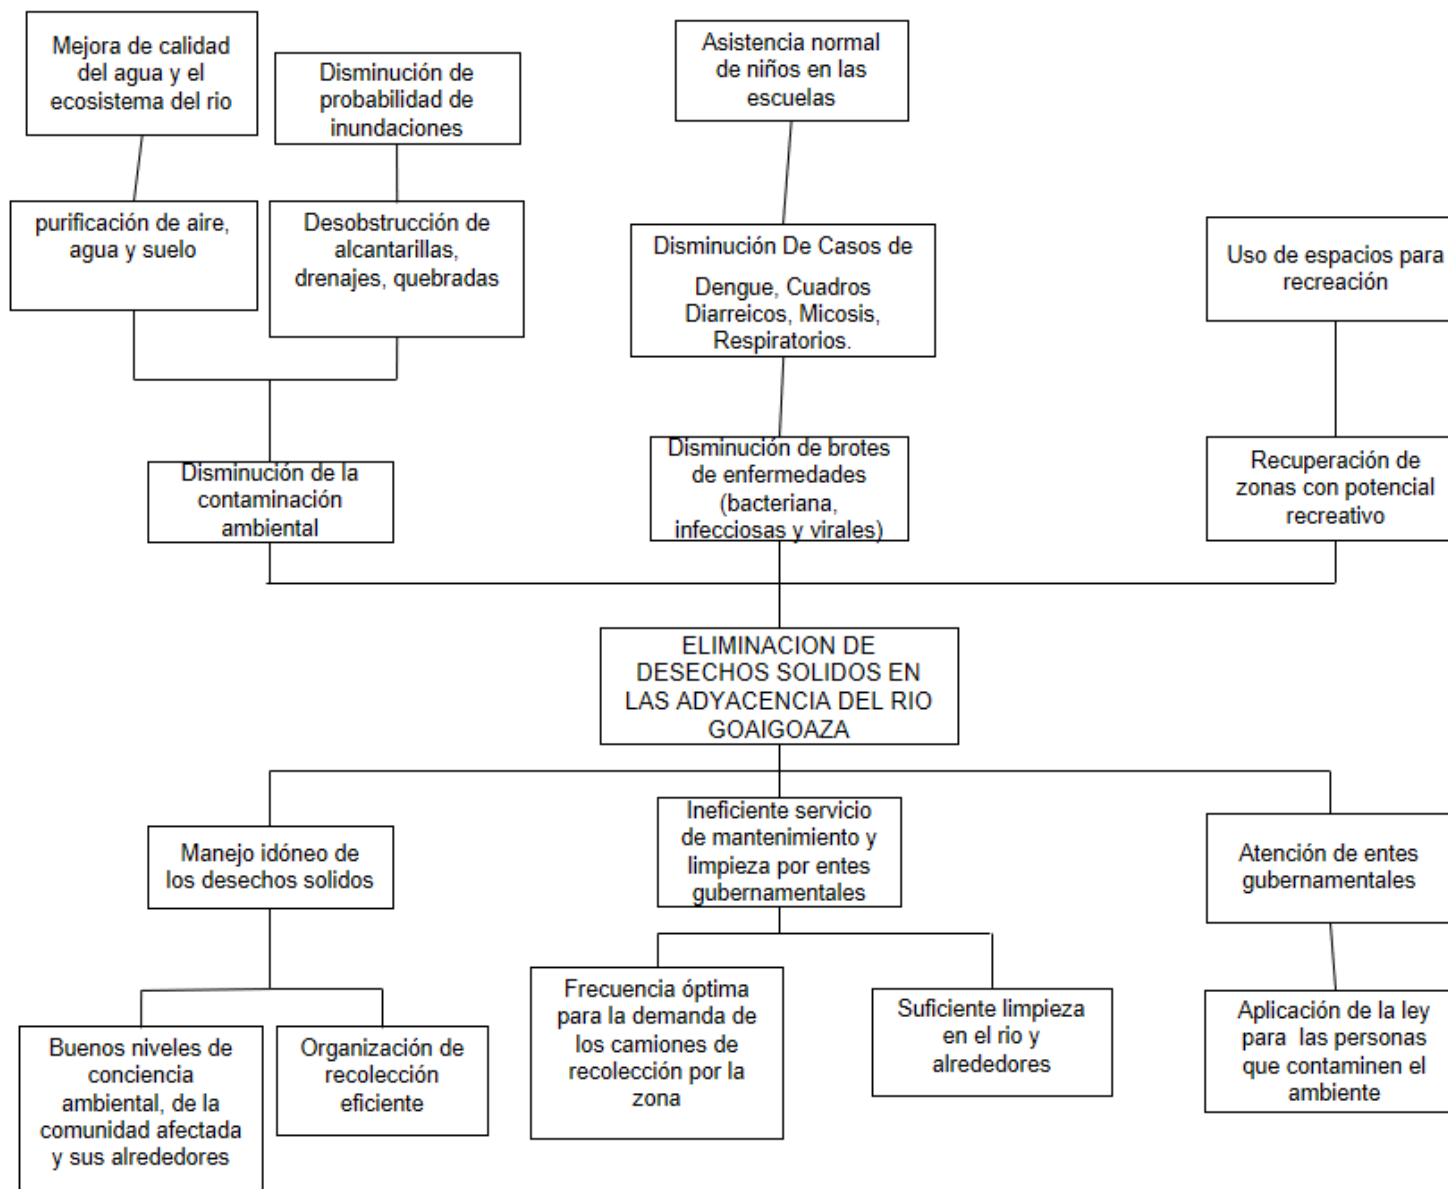

11.4 Matriz de Marco Lógico

ELEMENTOS EAP	Resumen narrativo de objetivos	Indicadores verificables de logro	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la CALLE PRINCIPAL MIQUIJA mediante condiciones ambientales saludables	Se logró la opinión positiva del 90% de la comunidad sobre la mejora de los espacios al finalizar el proyecto	Encuesta	Las encuestas arrojan $\geq 90\%$ / las encuestas arrojan $< 90\%$
PROPÓSITO	Descontaminar las adyacencias del Río Goaigoaza, en el SECTOR MIQUIJA, CALLE PRINCIPAL MIQUIJA.	Ha disminuido en un 100% la presencia de desechos sólidos en el espacio adyacente al río y zona habitacional, al finalizar el proyecto	Registro fotográfico	Se encuentra libre de desechos: Sí/No
COMPONENTES	1- Realizar campañas de concientización a la comunidad central y cercana	- Se dictan 6 charlas en el espacio comunes de las comunidades para reclutar voluntariado, donación de insumos y promulgar normas de convivencia ambiental	Registro fotográfico	La población afectada y adyacente se compromete con la descontaminación / Solo la comunidad afectada se compromete con la descontaminación
		- Se plantea a IAMPROAM la situación problemática para contar con su disposición y conseguir apoyo en insumos o mano de obra en al menos dos reuniones	Registro fotográfico / Cartas de donación / constancia de participación	Ente se compromete a proveer / Ente se limita solo a recolectar
	2- Adecuar los espacios	- Ejecución de 3 Jornadas de limpieza para eliminar la totalidad de los desechos sólidos en la zona en cuestión	Informe de cantidad de objetos contaminantes por metro cuadrado	Reducción de objetos a 0 o ≥ 1
		- Disposición de dos espacios comunes, adecuados con 4 contenedores para la clasificación y el depósito temporal y rutinario de desechos	Cantidad de contenedores dispuestos, apreciables en registro fotográfico y constantes en facturación	Se aumentan cantidad de espacios / solo se organizan los espacios existentes
	3- Mejorar el servicio de recolección de basura	Duplicar la frecuencia de recolección semanal por parte del servicio municipal	Cantidad de veces que se ejecuta el servicio semanalmente según documento de planificación de IAMPROAM	Se logra aumentar la frecuencia / se realiza un ordenamiento más eficiente

ELEMENTOS EAP	Resumen narrativo de objetivos	Indicadores verificables de logro	Medios de verificación	Supuestos
ACTIVIDADES	1.1- Coordinación con consejos comunales	Gastos en transporte, hidratación y refrigerio.	Comprobantes de pago	Se consigue financiamiento / se prescinde de gastos innecesarios
	1.2- Coordinación con autoridad de IAMPROAM en pro de la jornada de limpieza	Gastos en transporte, hidratación y refrigerio.	Comprobantes de pago	Se consigue financiamiento / se prescinde de gastos innecesarios
	1.3- Campañas de concientización a las comunidades	-Gastos en transporte	Comprobantes de pago	Se consigue financiamiento / se prescinde del gasto
		- Hidratación y refrigerio.	- Registro fotográfico - Comprobantes de pago	Se consigue financiamiento / se prescinde de gastos innecesarios
	2.1 - Jornadas de Limpieza	- Gastos en implementos, Bolsas, herramientas, personal, transporte, hidratación y alimentación.	Comprobantes de pago	Se consigue financiamiento / es autofinanciado
		- Ejecución de la recolección en adyacencias del río	Registro fotográfico	Se consiguen trabajadores / es autogestionado por la comunidad afectada a través de voluntarios
	2.2 - Disposición de Contenedores de Basura	- Adquisición de 4 Contenedores de Basura para su depósito y clasificación	Comprobantes de pago	Se consigue financiamiento / es autofinanciado
	2.3 - Coordinación con autoridad de IAMPROAM en pro de aumentar la frecuencia de recolección	- Gastos en transporte, hidratación y refrigerio.	Comprobantes de pago	Se acuerda duplicar la frecuencia / se genera campaña en medios
	3.1 - Seguimiento de la planificación de recolección	- Gastos en transporte	Registro fotográfico	Se evidencia el aumento de la frecuencia / se genera campaña en medios

OTROS ANEXOS



Calle principal de miquija donde se va a efectuar la limpieza del área.





Las adyacencias del río goaigoaza pasando por las calle principal del sector miquija, donde se puede evidenciar desechos solidos en el área,



Reunión con el consejo comunal del sector.



Reunido con la ente gubernamental IAMPROAM.

BIBLIOGRAFÍA

Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 (1.999).

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Gaceta Oficial N° 38.204 (2005).

Ortegón E., Pacheco J. P., Prieto A. (2005). Metodología del Marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Publicación de las Naciones Unidas.
