

Programa de Gerencia Pública y Gobernabilidad Democrática

Empoderamiento de los ciudadanos para producir impacto en su calidad de vida y en el desarrollo de su comunidad mediante su formación, organización y activación para generar el cambio político que requiere el país

Participantes:

Chacón, Berlytz	C.I. 3.396.964
Chacón, Francia	C.I. 5.132.356
Perozo, Yelitza	C.I. 7.682.193
Gherzi, Luis.	C.I. 5.304.550
Reyes, Alejandro	C.I. 11.232.808

Septiembre 2024

TABLA DE CONTENIDO

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

1. UBICACIÓN, SITUACIÓN INICIAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
4. RESULTADOS ESPERADOS
5. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
 - 5.1.1. Fin
 - 5.1.2. Propósito
 - 5.1.3. Componentes
6. POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
7. PLAN DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
 - 7.1. Las actividades del proyecto.
 - 7.2. La puesta en marcha
8. RECURSOS REQUERIDOS
9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
10. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD, LA PARTICIPACIÓN Y LA APROPIACIÓN
11. ANEXOS OBLIGATORIOS
 - 11.1 Análisis de involucrados
 - 11.2 Árbol de problema
 - 11.3 Árbol de objetivos
 - 11.4 Matriz de Marco Lógico

OTROS ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO:

1. Nombre del Proyecto:

Empoderamiento de los ciudadanos para producir impacto en su calidad de vida y en el desarrollo de su comunidad mediante su formación, organización y activación para generar el cambio político que requiere el país

2. Breve descripción del proyecto:

Ante el complejo momento político que acontece en la vida de los venezolanos, el presente equipo, conformado por vecinos del Municipio Sucre del estado Miranda pertenecientes a Creemos Alianza Ciudadana, hemos decidido emprender este proyecto con el objetivo de motivar, organizar y articular a la ciudadanía desde sus comunidades, haciendo énfasis en la concientización sobre la necesidad de ejercer sus derechos para exigir la restitución de los valores democráticos en el país.

Se partirá con las comunidades de la Parroquia Leoncio Martínez, Municipio Sucre del estado Miranda, propiciando el empoderamiento de los vecinos de estas localidades, a fin de promover e impulsar el surgimiento de nuevos liderazgos que robustezcan la estructura comunitaria para la movilización y defensa de sus derechos. Se propone que el presente proyecto se convierta en un plan piloto que pueda ser replicado en otras localidades del estado Miranda y del país.

3. Ubicación detallada:

La Parroquia Leoncio Martínez pertenece al Municipio Sucre del estado Miranda y está conformada por comunidades de gran diversidad socioeconómica y está ubicada dentro del área metropolitana de Caracas. Su población está estimada en alrededor de 89.756 habitantes.

4. Duración total del proyecto:

El tiempo de ejecución del presente proyecto lo hemos estimado en dos años y esperamos que se constituya como un plan piloto para ser replicado en las otras localidades del estado y extensivo al país.

5. Responsable del proyecto:

El Ing. Luis Gheresi será el responsable de este proyecto junto a la Coordinación Ciudadana Local (CCL) de Leoncio Martínez, quien a su vez pertenece a la Coordinación Ciudadana Regional (CCR) del Estado Miranda, de la Plataforma Creemos Alianza Ciudadana.

La Estructura de Creemos Alianza Ciudadana está conformada por una Asamblea General Ciudadana que es la máxima autoridad de la Coordinación de Ciudadanos Nacional (CCN), la cual está constituida por los Coordinadores Ejecutivos de los estados, quienes son elegidos por las Coordinaciones de Ciudadanos Regionales (CCR) que a su vez, están constituidas por 7 ciudadanos elegidos en cada estado y finalmente, las Coordinaciones de Ciudadanos Locales (CCL) constituidas por 7 ciudadanos elegidos en cada agrupación de ciudadanos que hacen vida en cada estado.

5.1 Nombre de la organización: Creemos Alianza Ciudadana

5.2. Dirección: Av. Santa Teresa de Jesús con calle los Chaguaramos, Ed. Centro Javier, CIAP – UCAB, Urb. La Castellana, Municipio Chacao, Caracas

5.3 Correo electrónico: lgheresi@gmail.com

5.4 Teléfonos: 0414-100.99.39

5.5 Apellidos y Nombres del representante: Ing. Luis Gheresi

1. UBICACIÓN, SITUACIÓN INICIAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Se ha elegido la Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Sucre, estado Miranda, como el lugar de inicio para el desarrollo del presente proyecto por ser una localidad representativa del estado, donde se podrá ensayar como plan piloto que pueda replicarse en otras localidades del estado y el país.

La Parroquia está integrada por las urbanizaciones Boleíta, Campo Claro, La Carlota, Los Castaños, Los Chorros, Los Cortijos, Los Dos Caminos, Los Ruíces, Monte Cristo, Sector Parque del Este, Santa Cecilia, Santa Eduvigis, Santa María, Sebucán, El Sebucán, los barrios Agua de Maíz, Capitolio, La Lucha, Los Fernández, María Bernarda Pérez, Quebrada Tocomé, y los parcelamientos Alegría, Arismendi y El Rosario. y su población está estimada en 89.756 habitantes.



Ante la difícil situación política que atraviesa Venezuela es imperativo el movimiento ciudadano organizado para ejercer sus derechos políticos, sociales y económicos, pero al mismo tiempo es muy marcado el desinterés o apatía de las mayorías, en muchos casos por temor a represalias de las autoridades, o desinformación en cuanto al poder y capacidad de cambio que tienen estos movimientos. También por falta de credibilidad en líderes u organizaciones para accionar en defensa de sus derechos. En el presente proyecto se pretende hacer el contacto con los vecinos de las comunidades de manera directa, constante y consistente a través de actividades de interés general para generar la creación de un tejido social basado en intereses comunes y atractivos de modo que se vayan perfilando los nuevos conductores o líderes de acciones que surjan de la propia comunidad.

Para el 16 de septiembre del presente año, el estado Miranda, cuenta con 1.742 integrantes en la Plataforma de Creemos Alianza Ciudadana, lo que representa un 0.047% de la población del estado, estimada en 3.739.845 habitantes (proyección de población INE. Ene 2024), lo que representa el 4.22% del total de integrantes de Creemos Alianza Ciudadana a nivel nacional.

Contando con la información del periodo 2023-2024, y tomando en cuenta el 2.40% que representa la parroquia Leoncio Martínez en el estado, observamos que si hay 1.742 integrantes en la región, entonces para la parroquia deberían haber al menos 42 integrantes, actualmente cuenta con 62 integrantes que representan el 3.62% del total de integrantes de la región.

En este contexto, se ha decidido abordar esta situación desde una localidad del estado que sea representativa del comportamiento de los mirandinos, eligiendo la Parroquia Leoncio Martínez para dar inicio al presente proyecto y que derive en un plan piloto que pueda desplegarse a otras localidades del estado y el país, que permita a sus habitantes salvar esas brechas que le tienen distanciados del camino a su propia liberación a través de su empoderamiento, recuperando sus valores y fortalezas

ciudadanas y que definitivamente conducirán a recuperar la institucionalidad democrática.

En consecuencia, nos hemos planteado acometer el presente proyecto para el **empoderamiento de los ciudadanos para producir impacto en su calidad de vida y en el desarrollo de su comunidad mediante su formación, organización y activación para generar el cambio político que requiere el país,**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Objetivo Global de Impacto: El proyecto tiene como rumbo generar un aporte ciudadano con el trabajo mancomunado que debe hacer el país en general para la restitución de la institucionalidad del Estado y el rescate de los valores democráticos.

El objetivo general del proyecto será lograr, en principio, el empoderamiento de los ciudadanos en la Parroquia Leoncio Martínez para luego ampliar su ejecución a las demás localidades del estado Miranda y el país, que por ser uno de los estados más poblados del país, tendrá un impacto sustancial en el crecimiento de la población activamente organizada, sumando cantidades importantes a las metas de crecimiento que ha desplegado Creemos Alianza Ciudadana, estimadas en la incorporación de más de 7.000 nuevos miembros en el estado Miranda.

Objetivos específicos: Los objetivos específicos que se tienen trazados para el éxito de nuestro proyecto son:

1. La activación, articulación y movilización de los integrantes de Creemos Alianza Ciudadana de la Parroquia Leoncio Martínez.
2. Posicionamiento de Creemos Alianza Ciudadana como referencia de articulación, formación y organización de los ciudadanos de la parroquia Leoncio Martínez.

3. Incentivar, movilizar y articular a los ciudadanos de la parroquia Leoncio Martínez, como partícipes del movimiento nacional para el rescate y defensa de la democracia en el país.
4. Consolidar y fortalecer la estructura de Creemos Alianza Ciudadana con la activación de los ciudadanos para el ejercicio de la ciudadanía y defensa de sus derechos políticos y sociales.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Venezuela requiere la participación ciudadana en las comunidades y para lograrlo se requiere del empoderamiento ciudadano. Y para llegar a este empoderamiento, la vía es a través del trabajo sostenido de sus líderes y representantes, al ofrecer y brindar oportunidades y accesibilidad, a través de la formación y organización ciudadana. Es vital transmitir a la población el poder que tiene el movimiento ciudadano en la lucha por la defensa de sus derechos y por recobrar la institucionalidad y valores democráticos. Ante el desconocimiento de la ciudadanía, la indiferencia, el miedo, la entrega o la falsa creencia de no tener la fuerza ni medios suficientes para lograr estas metas, es fundamental concientizar e internalizar en el ciudadano común que los movimientos organizados, pacíficos y articulados son un elemento clave y de gran potencialidad para alcanzar cambios en la dirección que el país necesita.

Como parte de la sociedad civil que ha recibido formación, en nuestro caso, de Creemos Alianza Ciudadana, tenemos la posibilidad, herramientas y la determinación para ser transmisores de estas capacidades y llevar hasta nuestras propias comunidades estas enseñanzas, impartiendo conocimiento, motivando e involucrándose en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. Más allá de un sentido político, puede verse en términos de conocimiento y oportunidades, como la inclusión digital, el emprendimiento, la oratoria y muchos aspectos más que son beneficiosos para cualquier ser humano.

Con la participación activa de los ciudadanos empoderados, se evitaría el aumento de los problemas en sus comunidades, la aplicación de políticas públicas no alineadas a las necesidades reales de los ciudadanos, generar los cambios que todos queremos, que hoy parecen imposibles, pero que empoderados, serán muy posibles de alcanzar, así como otras circunstancias políticas y sociales en las que estamos inmersos, ya que sin la articulación, organización y movilización no podremos contribuir con la necesario participación de todos en la construcción de una democracia plena en Venezuela..

4. RESULTADOS ESPERADOS

Este proyecto pretende formar líderes que promuevan la participación ciudadana en la defensa de sus derechos políticos. Estos ciudadanos estarán organizados y registrados en la Plataforma de Creemos Alianza Ciudadana con la cual se les mantendrá informados y preparados para las acciones cívicas necesarias. Este grupo, de ciudadanos altamente motivados, participará en las actividades diseñadas para propiciar el crecimiento del grupo y garantizar su incidencia en los futuros proyectos de la comunidad. El crecimiento esperado de este grupo será del 10% mensual por un período de dos años con lo cual alcanzaremos un crecimiento por encima del 799% sobre el registro actual de la parroquia Leoncio Martínez. Una vez logrados estos primeros resultados, los ciudadanos habrán adquirido conciencia de su “Poder” y de esta forma, la comunidad de ciudadanos activos se alimentará con sus propios proyectos, lo cual garantizará la sustentabilidad de los resultados.

5. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

Desde Creemos Alianza Ciudadana nos mueve la misma visión de “ser una plataforma amplia e inclusiva de articulación para la acción coordinada y la movilización ciudadana, conformada por organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos comprometidos con la “causa democrática” que estén dispuestos a ser parte de un esfuerzo a escala nacional para recuperar la democracia en Venezuela”.

El presente proyecto aspira contribuir con el objetivo de reforzamiento de los valores ciudadanos para el ejercicio de las libertades democráticas. Para ello planteamos como objetivo general o propósito, el Empoderamiento de los ciudadanos para la acción coordinada y la movilización por la causa democrática.

Los objetivos específicos o componentes que hemos considerado son los siguientes:

5.1. Estructura fortalecida de Creemos Alianza Ciudadana con la activación de los ciudadanos comprometidos. Siendo la formación un pilar importante para ejercer la ciudadanía con la capacitación necesaria y la concientización en cuanto a valores de la participación ciudadana, como son la responsabilidad, solidaridad y tolerancia. , siempre y cuando mantengamos activa la Coordinación Ciudadana Local (Fig.1) de la parroquia Leoncio Martínez, abocada a incentivar la participación ciudadana.

5.2. Incentivar, movilizar y articular a los ciudadanos de la parroquia Leoncio Martínez, para lo cual se realizarán al menos 10 asambleas de ciudadanos, 5 charlas de Los Valores de la Participación, 24 reuniones, 15 Talleres, 5 cine foros, entre otras actividades para organizar a los ciudadanos e implementar la estrategia de REMAR (Reclutar, Educar, Multiplicar, Activar y Repetir) de Creemos Alianza Ciudadana.

5.3. Posicionamiento de Creemos Alianza Ciudadana como referencia de articulación, formación y organización de los ciudadanos de la parroquia Leoncio Martínez. Con la activación de equipos que conforman la Coordinación Ciudadana Local para dar a conocer la Plataforma, sus principios y valores, visión, misión y compromiso con Venezuela. Se realizarán reuniones informativas y se Implementará la actividad de “Creemos en gotas”, que serán tips informativos sobre Creemos Alianza Ciudadana a través de las redes sociales con una frecuencia de al menos dos veces por semana.

5.4. Activación, articulación y movilización de los integrantes de Creemos Alianza Ciudadana de la Parroquia Leoncio Martínez, para lo cual se implementarán nuevas acciones alineadas a los intereses de las comunidades (formativas, informativas, motivacionales, otras) con el objetivo de acercar a los ciudadanos y captar su atención

en busca de despertar de la conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de la participación ciudadana en los espacios que corresponda. En este sentido se realizarán reuniones de acercamiento con cada comunidad, se realizaran encuestas, y otras actividades con la participación del CCL correspondiente. De esta manera iniciar el proceso de captación de nuevos ciudadanos para su incorporación a la Plataforma de Creemos Alianza Ciudadana.

6. POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El proyecto será direccionado a incentivar y motivar la participación ciudadana de manera activa lo que se espera produzca la integración de una parte de esta comunidad a las filas de la Plataforma Creemos Alianza Ciudadana. La población de La Parroquia está estimada, según proyección del INE para enero 2024, en aproximadamente 89.756 habitantes.

		Cantidad
La comunidad en general P.L.M.		89.756

Siendo uno de los preceptos principales de Creemos Alianza Ciudadana el motivar la participación, integración y articulación de la ciudadanía y las organizaciones activas en solucionar los problemas comunitarios y trabajar en función de profundizar la democracia, esto mismo impulsará la participación de la sociedad civil en su conjunto, a que su voz tenga peso en las decisiones de las diferentes instancias de poder público, con lo cual todos los ciudadanos se beneficiarán no sólo con acciones físicas sino con mayor seguridad del poder que tiene una sociedad que ejerza su acción ciudadana. De lograrse, se estará superando la paralización de una población que, por los rigores de la situación política del país, no logra impulsar soluciones realistas.

7. PLAN DE EJECUCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	AÑO 1 (meses)												AÑO 2 (meses)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS (Charlas, focus group, jornadas)	■	■	■																					
ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS (Foros, Cineforos)				■			■																	
ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS (Esparcimiento y diversión)	■						■																	
PUBLICACIONES EN RRSS (Creemos en gotas, encuestas)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
REUNIONES DE TRABAJO (Reciclaje, seguridad, etc.)	■		■	■	■	■		■		■	■		■		■		■		■					
ASAMBLEAS CIUDADANAS (Temas de interés común)					■		■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
CINEFOROS (Cortometrajes)																■							■	
TALLERES (Liderazgo, Negociación Narrativa, Micros, Narrativa, Comunicación)							■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■
CHARLAS VIRTUALES (Tolerancia, solidaridad, responsabilidad)									■					■			■					■		

7.2 La puesta en marcha

Para poner en marcha el proyecto se seccionará toda la Parroquia en tres zonas urbanísticas principales de modo que se facilite su intervención e interacción con las comunidades y en general se haga más efectivo el trabajo en cada una de ellas.

En cuanto al equipo humano de trabajo estará formado por los cinco integrantes de este proyecto, coordinado por su representante, Ing. Luis Gherzi. Previo al inicio del trabajo, se convocará a los integrantes del CCL de Leoncio Martínez, para que se incorporen al equipo. Se conformarán tres grupos de trabajo de modo que se distribuyan las responsabilidades diferenciadas sectorialmente en estos tres grupos, quedando así más focalizadas territorialmente las actividades y sea más efectiva la interacción con los vecinos. Una vez organizados los sectores y equipos, se comenzará la ejecución de las actividades del proyecto de acuerdo a lo programado.



PARTIDA	Recursos requeridos			Análisis de costos		
	Descripción específica del recurso requerido	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Sub total x partida US \$
Recursos humanos	Invitado especial	Hora	4	190	760	6.156,00
	Comunity Manager	Mes	24	152	3648	
	Instructor	Hora	34	38	1292	
	Ponente	Hora	12	38	456	
Materiales y suministros	Artículos de oficina varios	SG	46	9,5	437	874,00
	Gastos Varios	SG	46	9,5	437	
Servicios no profesionales	Alquiler local	Sesión	21	57	1197	1.197,00
Activos reales						
Viáticos y pasajes						
Otros costos						
		TOTAL PROYECTO US \$				8.227,00

9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

El seguimiento y la evaluación de la gestión consistirá fundamentalmente en evaluar los resultados alcanzados y compararlos con los resultados esperados. Así pues, siguiendo el plan del proyecto, haremos seguimiento al cumplimiento de los objetivos y las actividades que nos permitan alcanzarlos, las causas de éxito o del fracaso de las mismas, las actividades que debemos emprender para corregir las desviaciones y los nuevos objetivos que debemos trazarnos para asegurar el cumplimiento del plan.

El análisis del desempeño implicará evaluar la eficacia y evaluar el desempeño.

La eficacia será producto de la medición del impacto sobre el problema, producido por las actividades clave. Calcularemos la eficacia terminal, es decir a nivel de objetivos y la eficacia intermedia a nivel de sus causas.

La eficacia terminal medirá la participación de los ciudadanos de la parroquia Leoncio Martínez en Creemos Alianza Ciudadana y será calculada como la cantidad de ciudadanos activos en Creemos Alianzas Ciudadanas dividido entre el registro total de Creemos Alianza Ciudadana en la parroquia Leoncio Martínez multiplicado por 100 y expresado como un porcentaje de ciudadanos activos sobre el total de ciudadanos registrados en Creemos Alianza Ciudadana. La eficacia intermedia la mediremos para la causa clave la apatía y la calcularemos como ciudadanos dispuestos a participar, dividido entre el total de ciudadanos encuestados, multiplicado por 100 es decir, se expresará como un porcentaje de ciudadanos dispuestos sobre el total de ciudadanos encuestados.

Para las mediciones de desempeño consideraremos las actividades completadas a tiempo y el presupuesto ejecutado acorde al plan.

Utilizaremos un indicador de ejecución física del proyecto que se calculará como la cantidad de ciudadanos activos en un determinado tiempo, dividido entre los ciudadanos activos esperados para ese determinado tiempo según el plan, multiplicado

por 100 y expresado como un porcentaje. El indicador de ejecución presupuestaria será calculado como el presupuesto ejecutado, dividido entre el presupuesto planificado para un determinado tiempo, multiplicado por 100 y el indicador de eficiencia se calculará como la cantidad de registros obtenidos dividido entre los recursos utilizados a un determinado tiempo y se comparará con los resultados reales versus los esperados para ese determinado tiempo.

10. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD, LA PARTICIPACIÓN Y LA APROPIACIÓN.

Este proyecto culminado será entregado a la Coordinación Ciudadana Local (CCL) de la parroquia Leoncio Martínez, del municipio Sucre, del estado Miranda, quienes estarán involucrados en el desarrollo del mismo desde el principio. Como actividad inicial tendremos reuniones para revisar, discutir y adaptar el plan de trabajo del proyecto con los integrantes de la Coordinación Ciudadana Local.

Planificadas las etapas de acuerdo a los componentes, haremos actividades relacionadas con la motivación de los ciudadanos y su organización para dar a conocer qué es y cómo puede ayudarlos Creemos Alianza Ciudadana, para finalmente escoger y formar nuevos líderes comunitarios activados, este último es el componente identificado como raíz de las causas principales del problema.

La conformación del equipo para acometer el proyecto contará con la participación de los ciudadanos de la parroquia que muestren mayor interés en el mismo. Para esto se realizarán reuniones en tres zonas de la parroquia para explicarles el alcance inicial del proyecto y realizar análisis del mismo donde todos aprenderemos de la experiencia de los demás, desarrollando el sentido de pertenencia hacia el proyecto y el equipo de trabajo y el pleno conocimiento de la tarea que vamos a emprender. De esta manera aseguramos la sustentabilidad del proyecto porque involucramos a los actores desde el principio. Como resultado del trabajo en equipo desarrollaremos objetivos comunes,

tareas y responsabilidades claras, procedimientos adecuados, buenas relaciones personales e interdependencia entre los diferentes actores, lo cual garantiza la apropiación del mismo. Las actividades de formación de los nuevos líderes expresadas en nuestro plan de trabajo contemplan talleres de liderazgo, comunicación efectiva, herramientas para el líder, acciones de formación ciudadana, acciones pacíficas, narrativa y negociación. Con estas cubriremos la construcción de capacidades de los nuevos líderes y de la comunidad.

Al analizar las actividades de este proyecto encontramos que en su mayoría dependen del equipo que llevará a cabo el proyecto. En menor grado hay otros actores involucrados como es la seguridad urbana. Los elementos logísticos necesarios para las actividades que vamos a desempeñar, los cuales en su mayoría están en manos del decisor, específicamente constituyen la contratación de locales, espacios que requieren permisos parroquiales y/o municipales y la coordinación con actores dispuestos a dar talleres de formación, foros, cine foros y jornadas ambientales y deportivas.

Principalmente los riesgos sociales corresponden a la apatía, al miedo y a la disponibilidad de tiempo para ejecutar las actividades. Estos riesgos pueden ser mitigados o eliminados mediante acciones de promoción de los eventos, información oportuna y suficiente, sistemas de seguridad y ajustes a las fechas y horas planificadas. El riesgo político en cada una de las actividades públicas lo constituye el amedrentamiento que puede ser ejecutado por organismos de seguridad del municipio o del estado o por grupos de amedrentamiento político incentivados por el gobierno. Este riesgo debe ser previsto y mitigado por un grupo organizado de seguridad que acometa las acciones disuasivas y orientadoras al grupo que ejecuta la actividad. Para esto es necesario consultar a los expertos, preparar un plan para cada actividad y llevarlo a cabo con el personal correspondiente.


En el desarrollo del proyecto se pueden contemplar otros análisis de mayor profundidad, como análisis de escenarios y/o estratégicos dónde se ajusten a nuevos actores, sus capacidades, posiciones y situaciones no previstas.

11. ANEXOS


11.1 Análisis de los involucrados

Grupos	Intereses del grupo	Problemas percibidos	Interés en el proyecto	Conflictos potenciales
Ciudadanos	Un cambio Calidad de vida	Falta de organización y articulación	Medio -	No activación de los ciudadanos
Líderes Comunitarios	Impulsar soluciones a las comunidades	Apatía de los ciudadanos	Alto +	Falta de recursos y apoyo
Asociaciones de Vecinos	Impulsar soluciones a las comunidades	Respuestas tardías de los entes del estado	Alto -	No favorecer acceso de C.A.C. en sus comunidades
ONG/OSC	Organizar a los ciudadanos en diversas áreas de acción	Apatía, poca participación de los ciudadanos	Bajo +	Competencia de recursos y visibilidad
Partidos Políticos	Gobernar	Pocos integrantes en sus cuadros	Medio -	Aprovechar para aumentar sus filas
Gobierno	Control Social	Nueva ley que regula las ONG / OSC	Bajo -	Aplicación de la nueva ley
Fuerzas de Seguridad del estado	Mantener el orden público	Acoso ciudadano, represión, violación DDHH	Bajo -	Reclusión de activistas
Universidades	Educación	Miedo a represiones políticas	Medio	Cierre de Universidad, amenazas
Medios de Comunicación	Información veraz y oportuna	Censura previa		Libertad de expresión censurada
Iglesias	Bienestar de su feligresía	Indiferencia		Sacerdotes esperan autorización superior
Consejos Comunales	Control Social, "bienestar" de sus comunidades	Muchos son rama del partido de gobierno, siguen sus lineamientos	Bajo +	Inseguridad

11.2 Árbol de problema

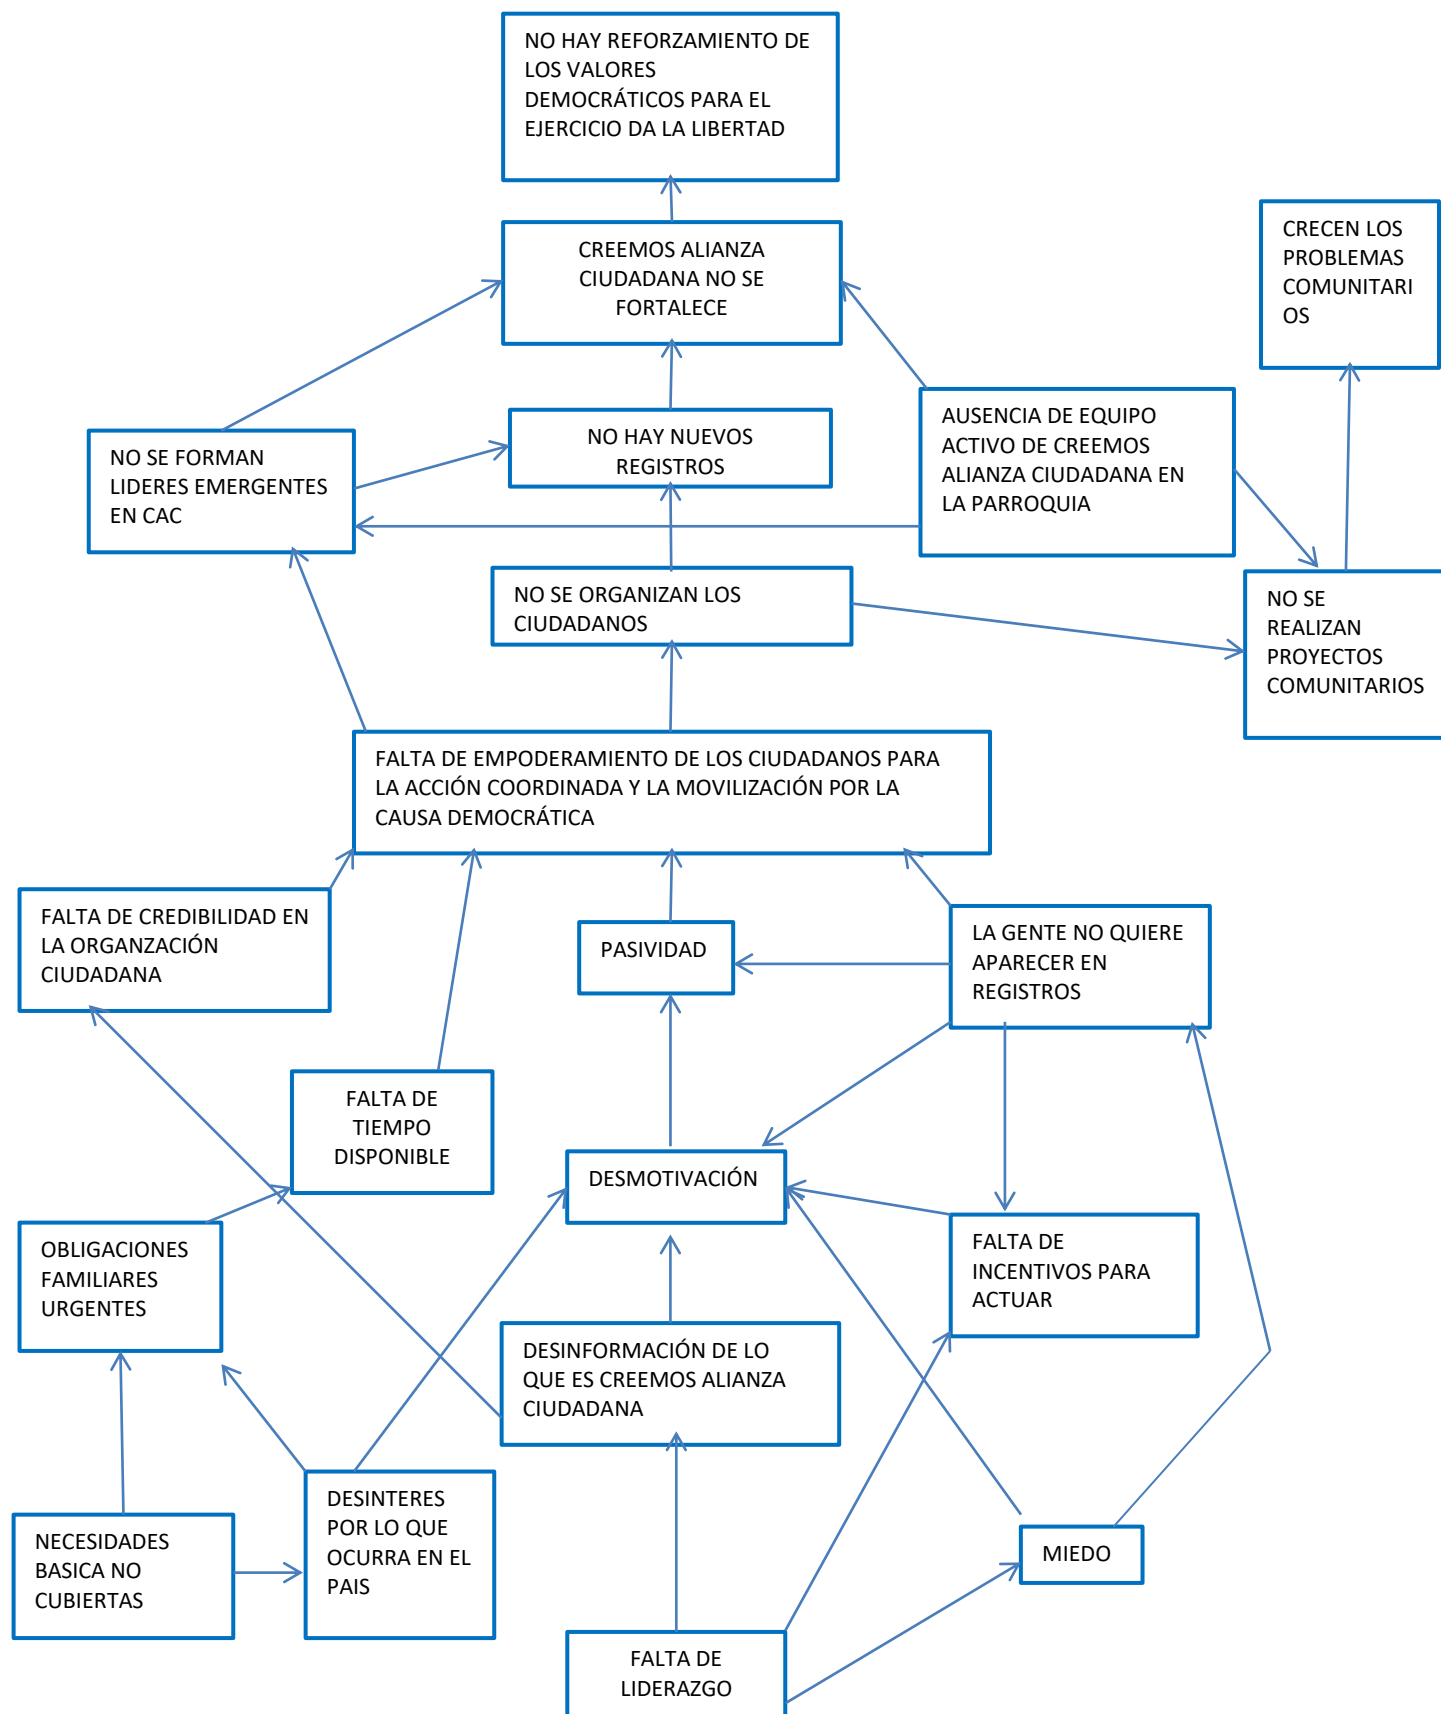

11.3 Árbol de Objetivos

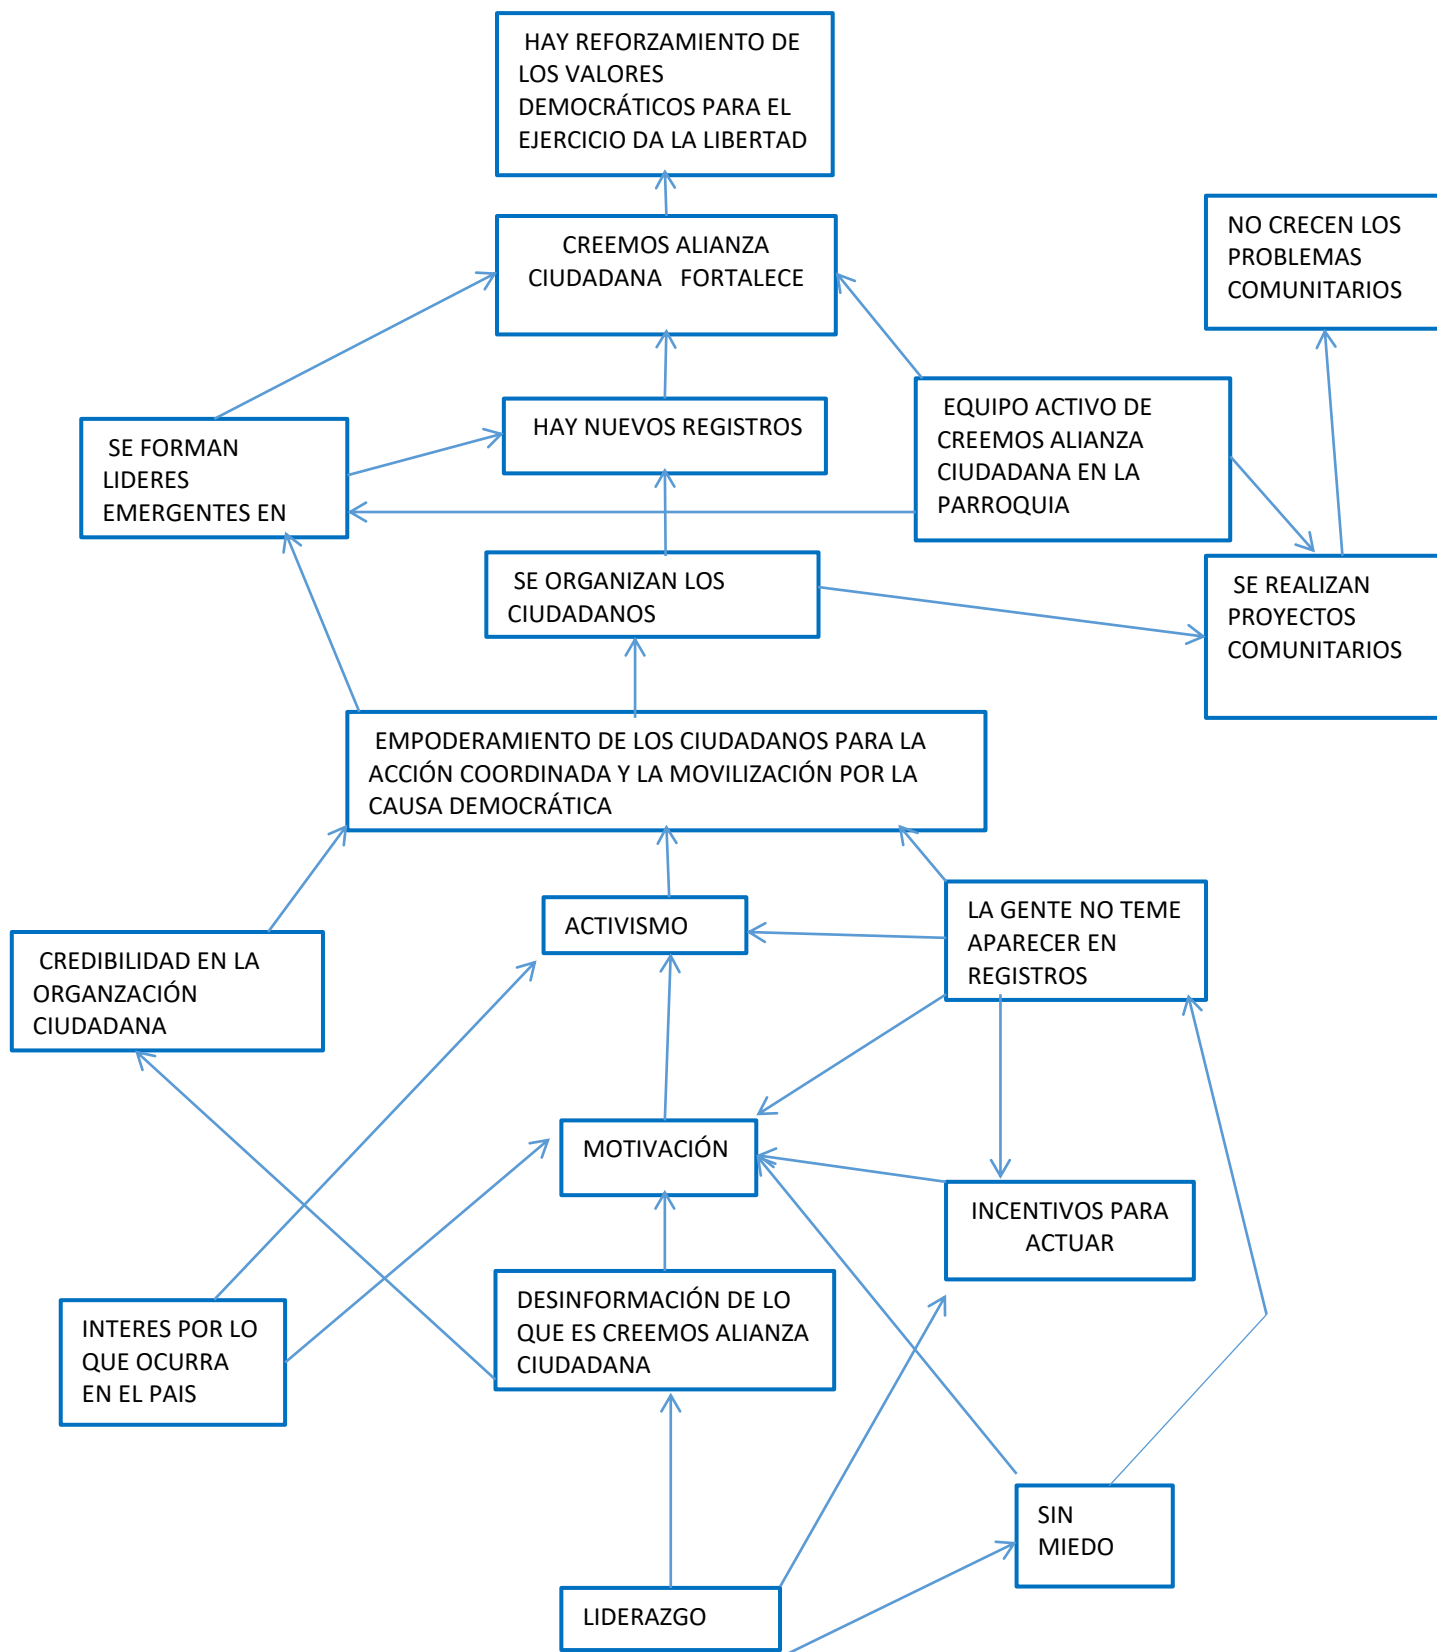

11.4 Matriz de Marco Lógico

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Reforzamiento de los valores democráticos para el ejercicio de la libertad.	Ejercicio de derechos civiles y políticos	Monitor Cívico, V-Dem, otros (CIP)	Democracia plena en Venezuela
PROPOSITO	Empoderamiento de los ciudadanos para la acción coordinada y la movilización por la causa democrática.	Número de Miembros de Creemos Alianza Ciudadana que son reconocidos y participan activamente en la movilización para la defensa de sus derechos	Base de datos de Creemos Alianza Ciudadana Registro de actividades en la plataforma CAC	Preceptos y valores Constitucionales que otorgan derechos de participación y empoderamiento al ciudadano se mantienen vigentes
COMPONENTES	1. Estructura fortalecida de Creemos Alianza Ciudadana en la activación de los ciudadanos comprometidos.	Numero de nuevos ciudadanos incorporados en la Plataforma de Creemos Alianza Ciudadana	Base de datos de Creemos Alianza Ciudadana de la parroquia Leoncio Martínez	Ciudadanos comprometidos con el ejercicio de su ciudadanía. Respeto a la libertad de reunirse y asociarse contemplado en la CRBV
	2. Incentivar, movilizar y articular a los ciudadanos de la parroquia Leoncio Martínez	Número de eventos realizados	Reporte de eventos a CAC a través de la web	Ciudadanos comprometidos con el ejercicio de su ciudadanía. Respeto a la libertad de reunirse y asociarse contemplado en la CRBV
	3. Posicionamiento de Creemos Alianza Ciudadana como referencia de articulación, formación y organización de los ciudadanos de la parroquia Leoncio Martínez.	Número de ciudadanos asistentes. Número de eventos realizados	Lista de asistencia Reporte de actividades a CAC	Respeto a la libertad de reunirse y asociarse contemplado en la CRBV RRSS activas

	4. Activación, articulación y movilización de los integrantes de Creemos Alianza Ciudadana de la Parroquia Leoncio Martínez	Número de integrantes activos Lista de asistencia a las actividades	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	Vigentes los preceptos que permiten la libre asociación, las libertades de reunión y participación ciudadana previstas en la Constitución.
ACTIVIDADES	1. Formación en liderazgo, a través de diversas herramientas de capacitación. (Focus Group, Talleres...)	Número de actividades de formación realizadas. Número de asistentes.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	Respeto a la libertad de reunirse y asociarse contemplado en la CRBV
	1.1-A Taller de Liderazgo,	Número de actividades de formación realizadas. Número de asistentes.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	Respeto a la libertad de reunirse y asociarse contemplado en la CRBV
	1.1-B Taller de Negociación.	Número de actividades de formación realizadas. Número de asistentes.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	Respeto a la libertad de reunirse y asociarse contemplado en la CRBV
	1.1-C Taller comunicación efectiva,	Número de actividades de formación realizadas. Número de asistentes.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	Respeto a la libertad de reunirse y asociarse contemplado en la CRBV
	1.1-D Curso (micro talleres o foros) de El Poder de la Gente,	Número de actividades de formación realizadas. Número de asistentes.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	Respeto a la libertad de reunirse y asociarse contemplado en la CRBV
	1.1-E Taller de Narrativa	Número de actividades de formación realizadas. Número de asistentes.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	Respeto a la libertad de reunirse y asociarse contemplado en la CRBV
	1,2 Charlas para concientizar en los valores de la participación ciudadana, (responsabilidad, solidaridad y tolerancia) a través de las RRSS	Número de publicaciones realizadas en las diferentes RRSS	Reporte de publicaciones en RRSS a Creemos Alianza Ciudadana	Respeto a la libertad de reunirse y asociarse contemplado en la CRBV

2.1 Asambleas ciudadanas para abordar diferentes temas de interés común.	Número de Asambleas realizadas Número de asistentes	Actas de asambleas realizadas Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	Respeto a la libertad de reunirse y asociarse contemplado en la CRBV
2.2 Reunión con ciudadanos interesados para incentivar a la acción	Número de asistentes	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	Respeto a la libertad de reunirse y asociarse contemplado en la CRBV
2.3 Cine foro (Cortometrajes)	Número de asistentes	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	Respeto a la libertad de reunirse y asociarse contemplado en la CRBV
3.1 Creemos en gotas en redes sociales (Fig. 2)	Número de publicaciones en RRSS	Reporte de publicaciones en RRSS a Creemos Alianza Ciudadana	<u>Preceptos vigentes del Derecho de Libertad de Expresión en RRSS</u> <u>RRSS activas</u>
3,2 Realizar reuniones de trabajo para abordar diversos temas (Focus Group, Charlas (Reciclaje, Seguridad...))	Número de reuniones realizadas. Listas de asistencia.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	
3,3 Asambleas ciudadanas acercando a Creemos Alianza Ciudadana a las comunidades	Número de reuniones realizadas. Listas de asistencia. Nuevos ciudadanos incorporados a la plataforma	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia Base de datos de Creemos Alianza Ciudadana.	
3.4 Reunión con los integrantes de Creemos Alianza Ciudadana, para organizar, activar y motivar	Reunión realizada Número de asistentes	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	

4. Implementar nuevas acciones alineadas a los intereses de las comunidades (formativas, informativas, motivacionales, otras)

Número de acciones realizadas.
Número de participantes

Reporte de actividades a CAC a través de la web
Listas de asistencia

4-A Focus Group	Número de actividades de formación realizadas. Número de asistentes.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	
4.B Charlas de Seguridad	Número de actividades de formación realizadas. Número de asistentes.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	
4.C Charlas de Reciclaje	Número de actividades de formación realizadas. Número de asistentes.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	
4.D Foros Venezuela Hoy	Número de actividades de formación realizadas. Número de asistentes.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	
4.E Cine foros (Intensamente2)	Número de actividades de formación realizadas. Número de asistentes.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	
4.F Jornadas de recuperación ambiental	Número de actividades de formación realizadas. Número de asistentes.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	
4.G Actividades de esparcimiento Claudio Nazoa	Número de actividades de formación realizadas. Número de asistentes.	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia	
4.1 Reunión con los ciudadanos interesados en activarse y participar en la organización ciudadana	Reuniones realizadas. Lista de asistencia Nuevos ciudadanos incorporados a la plataforma	Reporte de actividades a CAC a través de la web Listas de asistencia Base de datos de Creemos Alianza Ciudadana.	Creemos Alianza Ciudadana fortalecida
4,2 Aplicación de encuesta para conocer los intereses de los ciudadanos de la parroquia Leoncio Martínez.	Número de encuestas	Reporte de resultados a Creemos Alianza Ciudadana	100 encuestas realizadas

4.3 Reunión con
las diferentes
comunidades.
"Importancia de la
organización
ciudadana"

Reuniones realizadas.
Lista de asistencia

Reporte de
actividades a CAC a
través de la web
Listas de asistencia

Despertar ciudadano

4.4 Reunión con
los integrantes de
Creemos Alianza
Ciudadana de la
parroquia Leoncio
Martínez

Reunión realizada
Listas de asistencia

Reporte de
actividades a CAC a
través de la web
Listas de asistencia

Activados los
integrantes de
Creemos Alianza
Ciudadana

OTROS ANEXOS

Referencias

Fig. 1

Estructura Organizativa de Creemos Alianza Ciudadana

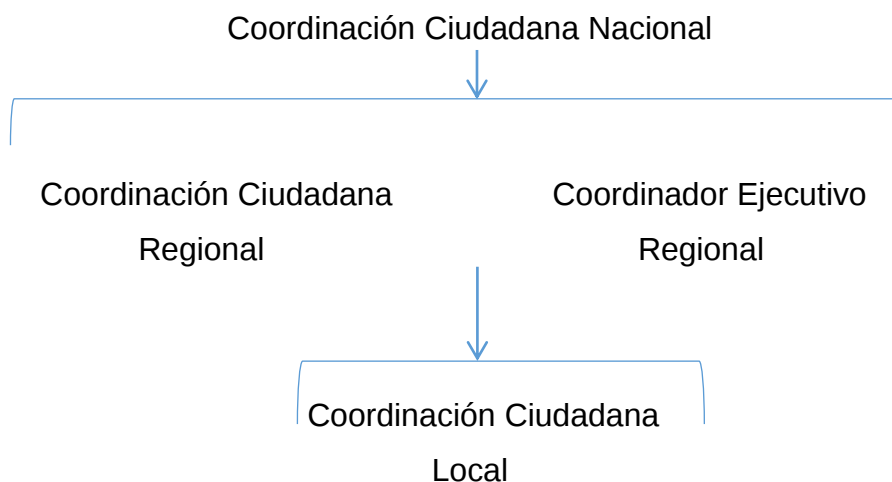


Fig. 2

Creemos en Gotas



BIBLOGRAFÍA

- “Cambios en el perfil de la migración, reportada desde los hogares venezolanos ENCOVI 2017-2023” Trabajo realizado en el marco del proyecto ACNUR – UCAB
- Informe anual 2023 Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno Observatorio Convivium de Dinámicas Comunitarias.
- Página web de la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Miranda.
- Tool Box; Caja de Herramientas, Franklin Pareja. “Guía Práctica de Planificación y Herramientas de Gestión”
- Planificación Estratégica por Problemas: Un Enfoque Participativo; Flavio Carucci T. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS). Caracas, 2003.
